




---- El presente CONVENIO se celebra el día 19 del mes de Marzo de dos mil dieciocho entre el Sr. Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Javier Alfredo IGUACEL (denominado en adelante “EL CONTRATANTE”), por una parte, y el Sr. Eduardo Carlos DRABBLE¹, representante de la U.T. NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A. – INGECO S.A.C.C.I.F.I.G.F. y S. (denominado en adelante “EL CONTRATISTA”), por la otra.-----

Por cuanto EL CONTRATANTE desea que EL CONTRATISTA ejecute las Obras denominadas LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 63/17, OBRA: DUPLICACION DE CALZADA. RUTAS NACIONALES N° 34, N° 66 Y N° 1V66. TRAMO: ACCESO A SALTA - SAN PEDRO DE JUJUY. LOTE 2: RUTA NACIONAL N° 66. EMPALME RUTA NACIONAL N° 1V66 - EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 Y RUTA NACIONAL N° 1V66. EMPALME RUTA NACIONAL N° 66 - EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 en jurisdicción de la PROVINCIA DE JUJUY, y ha aceptado la Oferta presentada por EL CONTRATISTA para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualquier defecto de las mismas. en un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses y en un plazo de garantía de doce (12) meses.-----

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.-----
2. Se considerará que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Convenio y deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales.
 - I) Carta de Aceptación
 - II) La Oferta / Formulario de Presupuesto de la Oferta corregido
 - III) Enmiendas Modificadorias N° 1 y N° 2 – Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2 y N° 3.
 - IV) Condiciones Especiales
 - V) Condiciones Generales
 - VI) Especificaciones
 - VII) Planos y
 - VIII) Formularios debidamente llenados y cualquier otro documento que forme parte del Contrato y del Expediente N° 5921/17 de la obra.


NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabble
VicePresidente


Ing. JAVIER IGUACEL
ADMINISTRADOR GENERAL
Direccion Nacional de Vialidad




- 3 Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hará a EL CONTRATISTA conforme se estipula en el presente Convenio, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente Convenio a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.-----
- 4 EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato² de PESOS, SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en las fechas y la forma allí establecidas.-----
- 5 Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA hará entrega de una Garantía a Primer Requerimiento que cubra el cinco por ciento (5 %) del monto de este contrato, la cual se incorporará al presente como ANEXO II.-----
- 6 En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los (....) días del mes de de dos mil dieciocho.-----

¹ En virtud de su designación a través de los Poderes emitidos para tal fin: y el Contrato Constitutivo de UT de fecha 11/12/2017 y modificatorio Inscripto en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro en el Libro N° 2 de Unión Transitoria de Empresas.-----

² Obra Adjudicada mediante RESOLUCION-2018-51-APN-DNV#MTR y su rectificatoria RESOLUCION-2018-139 APN-DNV#MTR, por el importe del monto corregido, obrante a fs. 17.777/17.793, incorporado al Contrato como ANEXO I, por la suma de PESOS, SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 751.790.472,61).-----


BORDESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabbio
VicePresidente


Ing. JAIME FIGUACEL
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Nacional de Vialidad

VIALIDAD
NACIONAL



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

CONTRATO DNV N° 04/18
EXPEDIENTE N° 5921/17
HOJA N° 1/1

ANEXO II

- DETALLE CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
(PUNTO 5 DEL CONVENIO) -

Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA ha entregado la Garantía de Cumplimiento a Primer Requerimiento N° 1957450 de fecha 22 de Febrero de 2.018 emitida por el BANCO CMF S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 37.589.523,63), importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto del Convenio.-----

RODESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabble
VicePresidente

Ing. JAVIER IGUAÇEL
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Nacional de Vialidad

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 1/17

ES COPIA

Gabriela C. Gutierrez
 Jefe Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FECHA: 14/07/2017

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 CONSTRUCTORA S.A.
 INGENCO S.A.
 CONSTRUCTORA S.A.
 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabbio
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
RUBRO	MOVILIZACIÓN, MOVILIDAD Y VIVIENDA PARA LA SUPERVISIÓN					
1	MOVILIZACIÓN DE OBRA	gl	1,00	Veintium millones setecientos sesenta y siete mil trescientos	21.767.300,00	21.767.300,00
2	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN	mes	48,00	Sesenta Mil Ochocientos treinta y cuatro con 90/100	60.834,90	2.920.075,20
A	CUOTA MENSUAL	km	216.000,00	cuatro con 68/100	4,68	1.010.880,00
B	ADICIONAL	mes	24,00	treinta y tres mil seiscientos cuarenta y siete con 40/100	33.647,40	807.537,60
3	VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN					
RUBRO	DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS					
4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	m²	6.484,00	treinta y tres con 54/100	33,54	217.473,36
5	DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	n°	30,00	veintinueve mil novecientos noventa con 75/100	29.990,75	899.722,50
6	DEMOLICIÓN DE CABECERAS DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	n°	23,00	siete mil cuatrocientos noventa y siete con 68/100	7.497,68	172.446,64
7	DEMOLICIÓN DE BARANDAS DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	n°	10,00	cañorce mil novecientos noventa y cinco con 38/100	14.995,38	149.953,80
8	DEMOLICIÓN DE PUENTES EXISTENTES					
				SUBTOTAL (a página siguiente)		27.945.388,10

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmante: S.A.C.C.I.I.A.G.F. y B.
 UNIÓN TRANSITORIA
 Roberto Sabat Masera

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmante: S.A.C.C.I.I.A.G.F. y B.
 UNIÓN TRANSITORIA
 Ing. Civil Gustavo Pedro de Casado

FOLIO

CONTRATO DNV N° 04/18
EXPEDIENTE N° 5921/17
LPI 63/17
ANEXO I
HOJA N° 2/17

ES COPIA

Gabriela C. Gutierrez
Jefa Sección Gestión Contractual
Subgerencia de Contratos

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabbio
Vicepresidente

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FECHA: 14/07/2017

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
TRAAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
TRAAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
PROVINCIA DE JUJUY

INGECO CONSTRUCTORA SA

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
A	RN 1V66 - Pr. 1+513.00	gl	1,00	trescientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta con 68/100	317.440,68	27.945.389,10
9	DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE HECHOS EXISTENTES	gl	1,00	noventa y un mil seiscientos treinta y cinco con 28/100	91.635,28	91.635,28
10	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	1.692,00	cuarenta y cinco con 82/100	45,82	77.527,44
11	RETIRO DE DEFENSA METÁLICA	m	7.361,40	ciento veintinueve con 39/100	129,39	952.491,55
12	TRASLADO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS EXISTENTES	m	105,00	un mil ciento quince con 10/100	1.115,10	117.085,50
A	DE BAJA TENSIÓN (50 V A 1.000 V)					
B	DE MEDIA TENSIÓN (1.000 V A 33.000 V)					
B1	Con columnas de hormigón	m	2.179,00	un mil seiscientos dieciséis con 90/100	1.616,90	3.523.225,10
C	DE ALTA TENSIÓN (> 33.000 V)	m	336,00	ocho mil ochocientos cincuenta y ocho con 85/100	8.858,85	2.976.573,60
13	TRASLADO DE FIBRA OPTICA EXISTENTE	m	2.265,00	cuatro mil trescientos treinta y seis con 50/100	4.336,50	9.822.172,50
14	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES	gl	1,00	setenta y dos mil quinientos uno con 73/100	72.501,73	72.501,73
15	OBLITERACION POR FRESADO DE					
SUBTOTAL (a página siguiente)						45.896.042,48

[Firma]
NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F.A.G.F. y U.
UNION TRANSITORIA
Roberto Sabatini

[Firma]
NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F.A.G.F. y U.
UNION TRANSITORIA
Ing. CIVIL CASIANO PESTUÑA CARRERA

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 3/17

ES COPIA

Gabriela C. Gutierrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabbio
 Vicepresidente



NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 CONSTRUCTORA
 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		45.896.042,48
		gl	1,00	doscientos ochenta y siete mil novecientos veintidos con 67/100	287.922,67	287.922,67
16	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EXISTENTE	ha	4,42	doce mil doscientos noventa y cinco con 81/100	12.295,81	54.347,48
17	MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO DESBOSQUE Y DESTRONQUE	m³	220,40	cincuenta y cinco con 19/100	55,19	12.163,88
18	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS DE DESAGÜE	m³	1.030.068,00	ciento setenta y cuatro con 96/100	174,96	180.220.697,28
	TERRAPLENES	m³	966,00	ciento setenta y cinco con 94/100	175,94	169.958,04
19	CONSTRUCCIÓN DE SUBRASANTE (REEMPLAZO) EN 0,30 m DE ESPESOR	m³	3.791,00	doscientos veintisiete con 08/100	227,08	860.860,28
20	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE GRANULAR INCLUIDO LOS MATERIALES EN 0,25 m DE ESPESOR	m³	6.813,24	doscientos cuarenta y nueve con 72/100	249,72	1.701.402,29
	BIEN 0,20 m DE ESPESOR	m³	58.559,35	doscientos cuarenta y nueve con 72/100	249,72	14.623.440,88
SUBTOTAL (ya página siguiente)						243.826.835,28

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGENIERO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F. Y A.
 UNION TRANSITORIA
 Ing. Civil Gustavo Pedro da Veiga

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGENIERO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F. Y A.
 UNION TRANSITORIA
 Roberto Sebastian Murillo

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 4/17

ES COPIA
 Ing. Eduardo C. Cuatrecasas
 en Seción Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

FECHA: 14/07/2017

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
 FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA


NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 CONSTRUCTORA

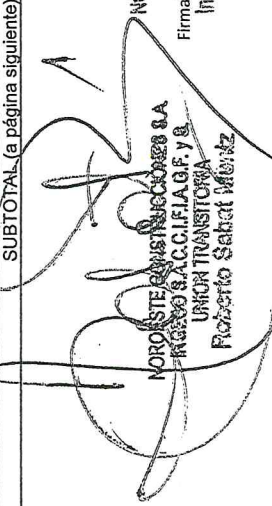
AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
					SUBTOTAL (de página anterior)	243.826.835,28
						6.045.766,15
21	C EN 0,15 m DE ESPESOR CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR INCLUIDO LOS MATERIALES A EN 0,20 m DE ESPESOR B EN 0,16 m DE ESPESOR	m ³ m ³ m ³	24.210,18 53.725,84 1.183,84	doscientos cuarenta y nueve con 72/100 doscientos cincuenta y uno con 96/100 doscientos cincuenta y uno con 96/100	249,72 251,96 251,96	13.536.762,65 298.280,33
22	EJECUCIÓN DE BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, INCLUIDO LOS MATERIALES A EN 0,08 m DE ESPESOR B EN 0,05 m DE ESPESOR C EN 0,04 m DE ESPESOR MEDIO	m ² m ² m ²	312.354,67 208.069,21 145.159,05	ciento setenta y siete con 16/100 ciento cuarenta y ocho con 66/100 ciento veinte con 16/100	177,16 148,66 120,16	55.336.753,34 30.931.568,76 17.442.311,45
23	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, INCLUIDO LOS MATERIALES A EN 0,08 m DE ESPESOR B EN 0,07 m DE ESPESOR	m ² m ²	100.470,25 42.259,75	doscientos setenta y seis con 89/100 doscientos cuarenta y ocho con 04/100	276,89 248,04	27.819.207,52 10.482.108,39
					SUBTOTAL (a página siguiente)	405.719.593,86


NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGENIERO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F. Y S.
 Firmado(s): LILIANA TRANSLIERA
 Ing. CIVIL Gustavo Pedro de Crespo


NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGENIERO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F. Y S.
 Firmado(s): LILIANA TRANSLIERA
 Roberto Sabat Mizent

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 5/17

ES COPIA
 Mariana C. Gutierrez
 de la Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
 FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
C	EN 0,06 m DE ESPESOR	m ²	2.090,50	doscientos nueve con 21/100	209,21	405.719.593,86
D	EN 0,05 m DE ESPESOR	m ²	431.339,46	ciento setenta y cinco con 37/100	175,37	437.353,51
24	EJECUCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN INCLUIDO EL MATERIAL	m ²	464.682,74	veintitres con 45/100	23,45	75.644.001,10
25	CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADOS INCLUIDO LOS MATERIALES EN 0,20 m DE ESPESOR	m ³	41.470,28	doscientos once con 56/100	211,56	10.896.810,25
26	SELLADO DE FISURAS	m	304.774,72	veintinueve con 65/100	29,65	8.773.452,44
27	BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA (SUPERFICIAL Y PROFUNDO)	m ³	21,87	siete mil sesenta con 11/100	7.060,11	9.036.570,45
28	FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE EN 15 mm ESPESOR PROMEDIO DE CRESTAS	m ²	46.935,00	cuarenta con 39/100	40,39	154.404,61
B	EN 35 mm ESPESOR PROMEDIO DE CRESTAS	m ²	36.564,76	cuarenta y dos con 58/100	42,58	1.895.704,65
					SUBTOTAL (a página siguiente)	1.556.927,48
					SUBTOTAL	514.114.818,34

FOLIO
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.C.I.F.L.S.D.F. y S. - 17
 Firmas: UNICION TRANSITORIA
 Ing. Chel Gustavo Pedro de Avignone
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.C.I.F.L.S.D.F. y S.
 UNICION TRANSITORIA
 Roberto Sabat Maritz

CONTRATO DNV N° 04/18
EXPEDIENTE N° 5921/17
LPI 63/17
ANEXO I
HOJA N° 6/17

ES COPIA
Gloria C. Quiroz
Jefa Sección Gestión Contractual
Superintendencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
CONSTRUCTORA SA
AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabble
Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
29	RUBRO OBRAS VARIAS EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE	m ³	8.507,24	ciento sesenta y dos con 71/100	162,71	514.114.818,34
30	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-4	m ³	77,98	tres mil doscientos noventa y nueve con 15/100	3.299,15	1.384.213,02
31	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-13	m ³	3.520,18	siete mil novecientos treinta y cuatro con 82/100	7.934,82	257.267,72
32	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-17	m ³	26,04	ocho mil novecientos siete con 90/100	8.907,90	27.931.994,67
33	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA	m ³	1.908,16	nueve mil seiscientos cincuenta y ocho con 26/100	9.758,26	231.961,72
34	ACERO ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO TIPO ADN 420	t	120,69	treinta y un mil trescientos trece con 40/100	31.313,40	18.620.321,40
35	REJAS PARA SUMIDEROS HORIZONTALES EN ALCANTARILLAS	n°	33,00	quince mil seiscientos cincuenta y siete con 64/100	15.657,64	3.779.214,25
				SUBTOTAL (de página anterior)		514.114.818,34
				SUBTOTAL (a página siguiente)		516.702,12
						566.836.493,22

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F.L.A.D.I.F.Y.B.
UNION TRANSGITONKA
Ing. Civil Gustavo Pablo de Cisneros

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F.L.A.D.I.F.Y.B.
UNION TRANSGITONKA
Roberto Sabat Marzetti

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 7/17

ES COPA
 Gabriela S. Gutiérrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

FECHA: 14/07/2017

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 CONSTRUCTORA S.A.
 INGECO

AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
36	REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	m ³	10,00	nueve mil trescientos noventa y uno con 98/100	9.391,98	566.836.493,22
37	ADECUACIÓN DE CANALES EXISTENTES	gl	1,00	trescientos setenta y dos mil novecientos siete con 33/100	372.907,33	93.919,80
38	CAÑO DE VENTEO PARA PROTECCIÓN DE GASODUCTO S/PLANO DGR/RA 0279	m	65,00	cinco mil cuarenta y dos con 73/100	5.042,73	327.907,33
39	RELLENO DE LA OBRA DE PROTECCIÓN DE GASODUCTO S/PLANO DGR/RA 0279	m ³	95,00	veintidos mil setecientos sesenta y seis con 63/100	22.766,63	327.777,45
40	CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS S/PLANO H-2840-H TIPO "C"	m	6.481,00	noventa y dos con 71/100	92,71	2.162.829,85
41	COLOCACIÓN DE TRANQUERAS DE MADERA S/PLANO J-5084 TIPO "B"	n°	1,00	veintinueve mil doscientos ochenta y cuatro	29.284,00	600.853,51
42	BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA, COLOCADA SEGÚN PLANO H-10237	m	15.528,90	novecientos veinticuatro con 26/100	924,26	29.284,00
	B Con longitud útil de 7.62 m	m	3.882,22	novecientos veinticuatro con 26/100	924,26	14.352.741,11
43	ADECUACIÓN PLANAL TIMÉTRICA DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES	gl	1,00	novecientos setenta y tres mil ochocientos uno con 63/100	973.801,63	3.588.180,66
SUBTOTAL (a página siguiente)					973.801,63	973.801,63
SUBTOTAL					\$89.338.788,57	\$89.338.788,57

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmado(s): INGECO S.A.C.C.I.E.L.A.G.F. y R.
 UNIÓN TRANSITORIA
 Roberto Sabat Maza
 Ing. Chil Gustavo Pedro de Céspedes

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 8/17

ES COPIA
 Oficina de Contratos
 Gerencia de Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
44	BARANDA DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY SEGÚN PLANO TIPO H-9197	m	3.196,00	seis milsetenta y nueve con 65/100	6.079,65	589.338.788,57
45	CORDÓN PARA PROTECCIÓN DE BORDE DEL PAVIMENTO	m	202,40	trescientos treinta y cinco con 12/100	335,12	19.430.581,40
46	CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO H-9121	m	884,00	ochocientos ochenta y tres con 63/100	883,63	67.828,29
	A TIPO "D" (altura 0,15 m)	m	823,90	setecientos cincuenta y seis con 95/100	756,95	869.491,92
	B TIPO "E" (altura 0,03 m)	m	84,00	ochocientos nueve con 86/100	809,86	623.651,11
	C TIPO "F" (altura variable)	m				68.028,24
47	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETETA EN BANQUINA SEGÚN DETALLE PTO	m	1.926,00	un mil ciento cincuenta y siete con 34/100	1.157,34	2.229.036,84
48	COLOCACIÓN DE COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO EN 0,23 m DE ESPESOR	m ²	157,00	quinientos sesenta y dos con 35/100	562,35	88.286,95
49	COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL	m ²	157,00	Veintidos con 34/100	22,34	3.507,38
SUBTOTAL (a página siguiente)					22,34	612.719.182,69

FOLIO
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.C.I.F.A.G.F. y S.A.
 UNION TRANSITORIA
 Ing. C.E. Sabat

Firmas:
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.C.I.F.A.G.F. y S.A.
 UNION TRANSITORIA
 Roberto Sabat

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 9/17

ES COMPA
 Gabriela C. Gutierrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 CONSTRUCTORA S.A.
 AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Draabie
 VicePresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		612.719.182,69
50	RUBRO OBRAS AMBIENTALES PLANTACIÓN DE ARBOLES	n°	1.241,00	quinientos trece con 63/100	513,63	637.414,83
51	CERCO VIVO ANTIENCANDILAMIENTO	m	3.308,00	doscientos nueve con 09/100	209,09	691.669,72
52	COLOCACIÓN DE CESTOS PARA RESIDUOS	n°	1,00	veinte mil ochocientos catorce con 13/100	20.814,13	20.814,13
53	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PARADAS DE ÓMNIBUS	n°	1,00	cientos setenta y seis mil novecientos noventa y dos con 76/100	176.992,76	176.992,76
54	TRASLADO DE SANTUARIOS Y CULTOS EXISTENTES	gl	1,00	ochenta mil seiscientos cuarenta y nueve con 67/100	80.649,67	80.649,67
					92.925,00	92.925,00
55	RUBRO PUENTES ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
A	RN 66 s/retorno Pr. 4+021 (Calz. asc.)	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
B	RN 66 s/retorno Pr. 4+021 (Calz. desc.)	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
C	RP 1 s/RN 66	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
D	RN 1V66 s/RP 53 Pr. 1+480 (c.a.)	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
				SUBTOTAL (a página siguiente)		614.698.423,80

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.I.A. S.R.L.
 UNIÓN TRANSITORIA
 Ing. Chel Custodio Paredes
 Roberto Sabat Maza

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 10/17

ES OIA
 Gabriela C. Gutiérrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FECHA: 14/07/2017

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
E	RN 1V66 s/RP 53 Pr. 1+480 (c.d)	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	614.698.423,80
F	RN 1V66 s/retorno Pr. 6+417 (Calz. asc.)	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
G	RN 1V66 s/retorno Pr. 6+417 (Calz. desc.)	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
H	Ex RN 34 s/RN 1V66	gl	1,00	Noventa y dos mil novecientos veinticinco	92.925,00	92.925,00
56	EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES	m³	4.124,16	doscientos cuatro con 61/100	204,61	843.844,38
57	CAMISAS METÁLICAS PERDIDAS PARA PILOTOS EXCAVADOS HORMIGONADOS IN SITU, ESPESOR 6 mm DIÁMETRO 1,20 m	m	32,45	dieciséis mil ochocientos con 16/100	16.800,16	545.165,19
58	DIÁMETRO 1,00 m HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUNTES, CLASE H-8 PARA LIMPIEZA	m	173,04	dieciséis mil ochocientos con 16/100	16.800,16	2.907.099,69
59	HORMIGÓN ARMADO CLASE H-21, CON CEMENTO ARS, EXCLUIDA LA ARMADURA	m³	177,58	cinco mil doscientos setenta y tres con 17/100	5.273,17	936.409,53
SUBTOTAL (a página siguiente)						620.302.642,58

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.C.I.F.A.O.F. Y S.
 UNION TRANSITORIA
 Ing. Chel Gustavo Paredes
 Roberto Sabat Méndez

Firma(s):
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGECO S.A.C.C.I.F.A.O.F. Y S.
 UNION TRANSITORIA
 Ing. Chel Gustavo Paredes
 Roberto Sabat Méndez

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 11/17

ES COPIA
 Gabriela C. Gutiérrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 G.ONS.STR.UCT.ORA
 AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
A	PARA CABEZALES DE PILOTES	m ³	176,95	ocho mil quinientos setenta y ocho con 70/100	8.578,70	620.302.642,58
B	PARA FUNDACIÓN DIRECTA	m ³	1.231,58	ocho mil quinientos setenta y ocho con 70/100	8.578,70	1.518.000,97
C	PARA ESTRIBOS	m ³	1.324,17	nueve mil seiscientos treinta y dos con 82/100	9.632,82	10.565.365,35
D	PARA COLUMNAS/TABIQUES PILA	m ³	118,85	nueve mil seiscientos treinta y dos con 82/100	9.632,82	12.755.491,26
60	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUESTOS CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA	m ³	199,49	nueve mil seiscientos treinta y dos con 82/100	9.632,82	1.921.651,26
A	PARA VIGA DE BANCADA DE PILA	m ³	4,36	nueve mil seiscientos treinta y dos con 82/100	9.632,82	41.999,10
B	PARA DADOS DE APOYOS DE VIGAS	m ³	13,17	nueve mil seiscientos treinta y dos con 82/100	9.632,82	126.864,24
C	PARA TOPES ANTISISMICOS	m ³	409,89	siete mil setecientos trece con 26/100	7.713,26	3.161.588,14
D	PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN	m ³	182,00	ocho mil trescientos veintinueve con 31/100	8.321,31	1.514.478,42
E	PARA DEFENSA NEW JERSEY Y CORDONES	m ³				
61	HORMIGÓN ARMADO CLASE H-25 CON CEMENTO ARS	m ³				
SUBTOTAL (a página siguiente)						653.052.931,97

FOLIO
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Necochea S.A.C.C.I.F.I.C.E. y S.
 UNION TRANSITORIA
 Firmado: Inq. Civil Gustavo Pedro de Gonzalez
 Roberto Sobat May 22

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 12/17

Gabriela C. Guerrero
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FECHA: 14/07/2017

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		
62	EXCLUIDA LA ARMADURA PARA PILOTOS	m ³	172,60	doce mil ciento noventa y siete con 08/100	12.197,08	2.105.216,01
	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUENTES CLASE H-30 EXCLUIDA LA ARMADURA	m ³	105,77	diez mil ciento sesenta y nueve con 97/100	10.169,97	1.075.677,73
	A VIGAS TRANSVERSALES DE TABLERO	m ³	375,94	diez mil ciento sesenta y nueve con 97/100	10.169,97	3.823.298,52
	B PARA LOSAS DE CALZADA Y VEREDAS	m ³	6,49	diez mil ciento sesenta y nueve con 97/100	10.169,97	66.003,11
	C PARA LOSAS DE CONTINUIDAD	m ³	126,27	diez mil ochocientos cuarenta con 41/100	10.840,41	1.368.818,57
63	D PARA VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO	m ³	1.131,42	diez mil novecientos noventa y nueve con 28/100	10.999,28	12.444.805,38
64	ACERO ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO	m ³				
SUBTOTAL (a página siguiente)						673.936.751,28

Roberto S. Lopez
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmas INGENCO S.A.C. INGENCO S.A. UNION TRANSITIVA S.A.
 Iny, CMI Ciudad de San Salvador de Jujuy

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmas INGENCO S.A.C. INGENCO S.A. UNION TRANSITIVA S.A.
 Roberto S. Lopez

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 13/17

ES COPIA
 Gabriela C. Gutiérrez
 Jefa Sección Gestión Contractiva
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 C. CONSTRUCTORA S.A.
 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		673.936.751,28
A	TIPO ADN 420 A PARA PILOTES EXCAVADOS HORMIGONADOS IN SITU	t	10,24	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	304.385,02
B	PARA CABEZALES DE PILOTES	t	13,91	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	413.476,14
C	PARA FUNDACIONES DIRECTAS	t	60,18	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	1.788.856,52
D	PARA ESTRIBOS	t	122,64	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	3.645.486,26
E	PARA PILAS	t	19,91	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	591.826,74
F	PARA LOSAS DE CALZADA Y VEREDAS	t	31,86	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	947.041,69
G	PARA LOSAS DE CONTINUIDAD	t	7,37	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	219.073,99
H	PARA DEFENSA NEW JERSEY Y CORDONES	t	11,01	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	327.273,35
I	PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN	t	46,44	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	1.380.433,64
J	PARA VIGAS PREFABRICADAS DE Hª°	t	19,81	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	588.854,23
SUBTOTAL (a página siguiente)						684.143.458,87

FOLIO
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmas(s): INGENIERO SACI, FIAG.F. Y S.A.
 UNION TRANSITIVA
 Ing. Chel Gastelvo Nieto de Castro

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INGENIERO SACI, FIAG.F. Y S.A.
 UNION TRANSITIVA
 Roberto Sobchik Muzic

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 14/17

Gabriela C. Guzmán
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
K	PARA VIGAS PREFABRICADAS DE H°P°	t	110,28	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	SUBTOTAL (de página anterior) 29.725,10	684.143.468,87
L	PARA VIGAS TRANSVERSALES	t	4,51	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	3.278.084,03
M	PARA DADOS DE APOYO DE VIGAS	t	0,90	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	134.060,20
N	PARA TOPES ANTISISMICOS	t	4,90	veintinueve mil setecientos veinticinco con 10/100	29.725,10	26.752,59
65	ACERO PARA PRETENSADO, COLOCADO Tensión de rotura: 1900 Mpa Tensión de fluencia: 1700 Mpa Baja Relajación	t	53,19	ciento dos mil quinientos ochenta y ocho con 20/100	102.588,20	5.456.666,36
66	JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA	m	216,59	cinco mil quinientos sesenta y dos con 27/100	5.562,27	1.204.732,06
67	BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA VEHICULAR, S/PLANO Z-4196 TIPO A	m	506,70	un mil novecientos veintisiete con 34/100	1.927,34	976.583,18
68	BARANDA METÁLICA PEATONAL, S/PLANO J-8714	m	138,12	seis mil trescientos sesenta y seis con 76/100	6.366,76	879.376,89
69	APOYOS DE NEOPRENO, COLOCADOS					
				SUBTOTAL (a página siguiente)		696.245.367,16

[Handwritten signature]
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Firmado SAC.C.I.F.I.A.G.E. y B.
 UNION TRANSITORIA
 Roberto Sabat Muzá
 Ing. Civil Gustavo Pedro de Castro

CONTRATO DNV N° 04/18
EXPEDIENTE N° 5921/17
LPI 63/17
ANEXO I
HOJA N° 15/17

ES OFERTA
Gabriela C. Guierrez
Jefa Sección Gestión Contractual
Gerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabble
Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
A	220 mm x 500 mm x 40 mm	n°	50,00	cinco mil quinientos ochenta y dos con 36/100	5.582,36	696.245.367,16
B	250 mm x 500 mm x 50 mm	n°	48,00	siete mil novecientos veintinueve con 50/100	7.929,50	279.118,00
C	130 mm x 500 mm x 30 mm	n°	40,00	dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 00/100	2.474,00	380.616,00
D	200 mm x 500 mm x 30 mm	n°	20,00	tres mil ochocientos seis con 16/100	3.806,16	98.960,00
70	TOPES ANTISISMICOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A 150 mm x 150 mm x 20 mm B 150 mm x 200 mm x 20 mm	n°	100,00	quinientos setenta con 92/100	570,92	57.092,00
71	SELLO ELÁSTICO, COLOCADO	n°	160,00	setecientos sesenta y uno con 23/100	761,23	121.796,80
72	CARPETA DE DESGASTE EN 0,05 m DE ESPESOR	m	192,00	doscientos sesenta y seis con 79/100	266,79	51.223,68
73	DESAGÜES EN EXTREMOS DE PUENTES, SEGÚN PLANO J-6710-I	m²	5.257,42	ciento noventa y dos con 68/100	192,68	1.012.998,69
		m	202,41	dos mil cuarenta y cuatro con 21/100	2.044,21	413.768,55
SUBTOTAL (a página siguiente)						698.737.065,07

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F. S.R.L.
UNION TRANSITORA
Ing. CHIL CARLOS FERRARI

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F. S.R.L.
UNION TRANSITORA
Ing. CHIL CARLOS FERRARI

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F. S.R.L.
UNION TRANSITORA
Ing. CHIL CARLOS FERRARI

CONTRATO DNV N° 04/18
 EXPEDIENTE N° 5921/17
 LPI 63/17
 ANEXO I
 HOJA N° 16/17

Gabriela C. Gutierrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FECHA: 14/07/2017

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA



AUTOPISTA RN N° 66
 AUTOPISTA RN N° 1 V 66
 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
 PROVINCIA DE JUJUY

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 Eduardo C. Drabble
 Vicepresidente

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números (de página anterior)	
74	TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS	n°	20,00	veintidos mil treinta y seis con 79/100	22.036,79	698.737.065,07
	A VIGAS DE 10.30 m DE LARGO	n°	10,00	veintidos mil treinta y seis con 79/100	22.036,79	440.735,80
	B VIGAS DE 20 m DE LARGO	n°	25,00	veintidos mil treinta y seis con 79/100	22.036,79	220.367,90
	C VIGAS DE 25 m DE LARGO	n°	24,00	veintidos mil treinta y seis con 79/100	22.036,79	550.919,75
	D VIGAS DE 30 m DE LARGO	m³	961,37	cinco mil cincuenta y cinco con 31/100	5.055,31	528.882,96
75	MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN S/P X-411	m²	4.642,00	cuatrocientos cuarenta y cuatro con 87/100	444,87	4.860.023,37
76	COLOCACIÓN DE COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO A EN 0.17 m DE ESPESOR	m²	4.642,00	Veintidos con 34/100	22,34	2.065.086,54
77	COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL	m²	6.582,15	trecientos setenta y uno con 70/100	371,70	103.702,28
RUBRO 78	SEÑALIZACIÓN	m²	2.556,00	dos mil quinientos cincuenta y seis con 80/100	1.486,80	2.446.585,16
	A POR PULVERIZACIÓN					
	B POR EXTRUSIÓN					
SUBTOTAL (a página siguiente)					1.486,80	3.800.260,80
SUBTOTAL					713.753.629,63	713.753.629,63

[Handwritten signature]
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INCECO S.A.C. S.R.L. S.A.
 UNION TRANSPORTERA
 Roberto Sabatini

FOLIO 17792
 NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
 INCECO S.A.C. S.R.L. S.A.
 Firmado: *[Handwritten signature]*
 Ing. Camilo Pardo de Larrazolo

CONTRATO DNV N° 04/18
EXPEDIENTE N° 5921/17
LPI 63/17
ANEXO I
HOJA N° 17/17

ES
Gabriela C. Gutierrez
Jefa Sección Gestión Contractual
Subgerencia de Contratos

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
Eduardo C. Drabble
Vicepresidente



AUTOPISTA RN N° 66 TRAMO: Emp. RN N° 1V66 - Emp. RN N° 34
AUTOPISTA RN N° 1 V 66 TRAMO: Emp. RN N° 66 - Emp. RN N° 34
PROVINCIA DE JUJUY

DOMICILIO: Necochea N° 225 Cuarto Piso Dpto "B" de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

FECHA: 14/07/2017

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En números	
C	LINEA CONFORMADA VIBRANTE	m ²	17.037,24	setecientos dieciocho con 62/100	SUBTOTAL (de página anterior)	713.753.629,63
D	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	n°	1.948,00	doscientos cuarenta y siete con 80/100		12.243.301,41
79	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m ²	336,00	tres mil seiscientos setenta y cinco con 44/100		482.714,40
80	MÉNSULAS SIMPLES - PROVISIÓN, MONTAJE, FUNDACIONES Y ACCESORIOS CON PLACA DE 3,60 m x 3,00 m	n°	32,00	noventa y cinco mil dieciséis con 30/100		1.234.947,84
81	PÓRTICO - PROVISIÓN, MONTAJE, FUNDACIONES Y ACCESORIOS	n°	10,00	cuatrocientos sesenta y un mil setecientos siete con 92/100		3.040.521,60
A	CON 2 PLACAS DE 3.60 m x 3.00 m	n°	1,00	cuatrocientos noventa mil cuatrocientos veinticinco con 17/100		4.617.079,20
B	CON 3 PLACAS DE 3.60 m x 3.00 m	n°	138,00	Ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres con 72/100		490.425,17
RUBRO 82	ILUMINACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACIÓN A Columnas de acero de 12 m de altura libre, 1 artefacto de 250 W SAP, brazo simple de 2,5 m	n°	1,00	Cuatro Millones con 0/100		11.927.853,36
RUBRO 83	SUMA PROVISIONAL SUMA PROVISIONAL S/ART. 13.5 del Pliego de Condiciones Particulares	gl				4.000.000,00
					Total Oferta	761.790.472,61

NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A.
INGECO S.A.C.C.I.F.A.G.I.
UNION TRANSITORIA
Firma: **Roberto Sabat-Menz**
Ing. Juan Carlos Ponce de Leon

